


三田キリスト教会プロジェクト記録 2021.06.17～07.06

記: 谷口

①2021.06.17 Ange の園の道路隣接部分（基礎）を掘削 AM8:30-PM2:30



②2021.06.18 施工写真（気象を考慮、AM 中で終了）
ガーデンフェンスの基礎をコンクリートで造る

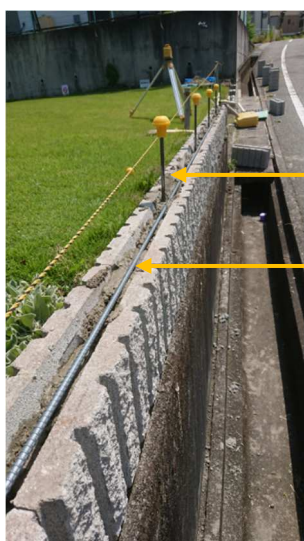

③2021.06.21 AM8:30-PM5:30

ブロック搬入

ブロック積み

縦筋

横筋



2021.06.22 雨どい設置

所要時間約 2 時間



2021.06.22 Ange の園のフェンス基礎完成→2021.06.24 フェンス設置予定
レーザー測量により、ブロックを水平に設置する（↓見事な職人技）





風のガーデン

「風のガーデン」は、脚本家・倉本聰が富良野を舞台にしたドラマ名です

2021.06.23 AM8:30-PM5:30

レーザー測量を行いながら、この作業だけで一日を費やす(見学していて勉強になる)。

→Welcome garden part II



2021.06.24 AM8:30-10:30

フェンス設置作業

工程写真：左→右→下（設置）

ブロック TOP 部分の仕上げ：2021.06.25 作業予定

2021.07.6 下記写真のポール2本(→部分)の撤去
新たにフックをブロック部分に新設



水道メーター検針の件につき、三田市水道局お客様センター（079-559-5157）に連絡済。

お客様番号：020-1-054-000-01 (2021.06.24 AM11:30)



2021.06.25／07.06 側溝蓋設置（三田市道路許可下付）



2021.06.25 フェンス基礎の TOP 部分のコンクリート仕上げ



風のガーデン

2021.06.25 駐車場花壇(二日目)
→Welcome garden part II（風のガーデン）

2021.07.06AM10:00 全工事完了確認（立ち合い：谷口）



風のガーデン

2021.06.26PM1:00-PM5:30 作業

花壇下部に鉢底石として小砂利を約 5 cm 程敷く。



2021.06.26

真砂土にバーク堆肥（樹木の皮 bark を原料とした堆肥）を混ぜ、土を作る

丁寧な作業は写真でも分かる

これらの作業だけで半日を費やす

※化学肥料を追加し、しばらく寝かし、土を作る予定（谷口）

2021.06.27（日）等：休み（所定休日及び雨予報で作業なし）



2021.06.28AM 車止めは、セメンダイン（車止め専用）ボンドで圧着固定
駐車場花壇&車止め（完成）

→左：Welcome garden part II（風のガーデン）、右：車止め

2021.07.06 H.Taniguchi

